



Nieuwsbrief restauratie klokkentoren

Nadat vorige week de timmerwerkzaamheden zijn afgerond, is deze week de loodgieter gestart met het bekleden van alle houten delen met lood om het hout te beschermen en de toren waterdicht te maken. Dit ambachtelijke werk wordt uitgevoerd door Walter Verhoeven BV uit Nieuwkuijk. Inmiddels zijn de bogen aan de bovenzijde van de toren met lood en het dakluik met zink bekleed.




De met lood beklede bogen en het met zink beklede dakluik.

Momenteel wordt gewerkt aan het met lood bekleden van de vloer onder de klok en de fundatiebalken van de klokkenstoel. Ook wordt een nieuwe waterdichte doorvoering aangebracht voor de bekabeling. De verwachting is dat deze werkzaamheden aanstaande maandag afgerond worden.



Voorbeeld van de werkzaamheden aan de fundatiebalken en de vloer.

Afgelopen zaterdag hebben de kerkrentmeesters de werkzaamheden bekeken en viel het op dat het voegwerk aan de onderzijde van het ronde raam, boven de entree, erg slecht is. Besloten is om dit te herstellen nu er een steiger voor het raam staat. Komende week worden deze voegen gerepareerd.

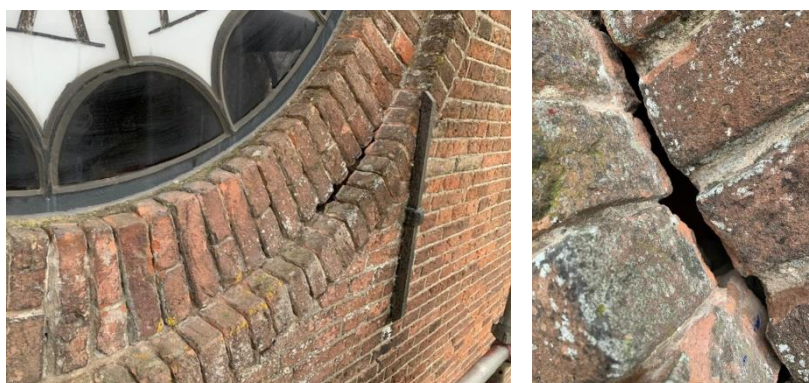

De slechte voegen onder het raam.

Tenslotte het nieuws waar we met z'n allen al sinds april van het afgelopen jaar op wachten: Komende woensdag 5 februari wordt de klok teruggeplaatst in de toren. 's Ochtends om 07.00 uur wordt een kraan opgesteld naast de kerk en zal Eijsbouts uit Asten de klok terugplaatsen. De klok is gereviseerd en voorzien van een nieuwe aandrijving en sensoren. De verwachting is dat Eijsbouts de werkzaamheden op één dag kan afronden. Vanaf woensdag zal de klok dus weer te horen zijn in Giessen en omgeving. Als laatste activiteit zal op vrijdag 7 februari de steiger worden afgebroken en afgevoerd.

Het college van kerkrentmeesters
